



बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
हेटौडा, नेपाल



आ.व.२०७८/०७९ को
वार्षिक प्रगति समीक्षा
०७९/०४/१२

प्रस्तुतकर्ता:
डा.सहदेव बहादुर भण्डारी
निर्देशक



अवस्था



क्र.सं.	कर्मचारीको पद	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
1	निर्देशक/अधिकृत एघारौं	१	१		
2	सि.डि.ई/अधिकृत दशौं/नवौं	२	०	२	
3	इन्जिनियर / अधिकृत आठौं/सातौं	५	३	२	२ जना करारमा
4	शाखा अधिकृत / अधिकृत आठौं/सातौं	१	०	१	
5	लेखा अधिकृत/लेखापाल / अधिकृत छैठौं	१	१	०	
6	ना.सु. / अधिकृत छैठौं	१	१		काजमा
7	सव-इन्जिनियर/ अधिकृत छैठौं	६	१	५	१ जना मासिक ज्यालादारीमा
8	ल्याब टे.	१		१	
9	ह.स.चा.	१	१	०	
10	का.स.	३	३	०	३ जना करारमा
	जम्मा	२२	११	११	

आ.व. 207८/०7९ को वार्षिक प्रगति अवस्था



विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण (रु. हजारमा)...




बजेटको विवरण	कुल बजेट	वार्षिक अवधिको मात्र				कै फि य त
		बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	
प्रादेशिक						
चालु	२५४१२	२५४१२	४१२८७८.१	५५.०१		
पूँजीगत	४५१३५०	४५१३५०	१३९७८.५०७	९१.४८	९३.०९	
जम्मा	४७६७६२	४७६७६२	४२६८५६.७	८९.५३	९३.०९	
संघीय सशर्त						
चालु						
पूँजीगत	८१५००	८१५००	६७५२६.९२	८२.८६	९०.६५	
जम्मा	८१५००	८१५००	६७५२६.९२	८२.८६	९०.६५	
कूल जम्मा	५५८२६२	५५८२६२	४९४३८३.५७	८८.५६	९१.८५	

निर्देशनालय तथा मातहतका निकायहरुको आ.व ०७८/०७९ मा विनियोजित वजेट र खर्चको विवरण

सि.नं	कार्यालय	पूँजीगत रु हजारमा			चालु रु हजारमा		
		बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	५३२८५०	४८०४२६	९०.१६	२५४१२	१३९७९	५५.०१
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	२०३६५३४	१२१३८९२	५९.६१	१५१११	१३७३१	९०.८७
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	१४०५०४३	८०२३०८	५७.१०	१५१८३	१३९७१	९२.०२
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	१९५८९७९	१०५०३०६	५३.६१	१५१०६	१४८२६	९८.१४
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१८६८३८९	११२३९१२	६०.१५	१५००९	११५६५	७७.०६
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	६२७०३६	३४०६०२	५४.३२	१३८४३	११८०५	८५.२८
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	१३११५००	७९७०७९	६०.७८	१४९१४	१००५०	६७.३९
८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिंग	११३७५११	६५५७२८	५७.६५	१९९५०	५६७१	२८.४३
९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१०८८९११	८५६३७२	७८.६४	२००१५	१०९५६	५४.७४
कुल जम्मा		११९६६७५३	७३२०६२५	६१.१७	१५४५४३	१०६५५४	६८.९५

निर्देशनालय तथा मातहतका निकायहरुको आ.व ०७८/०७९ मा भएको पुँजीगत खर्चको विवरण

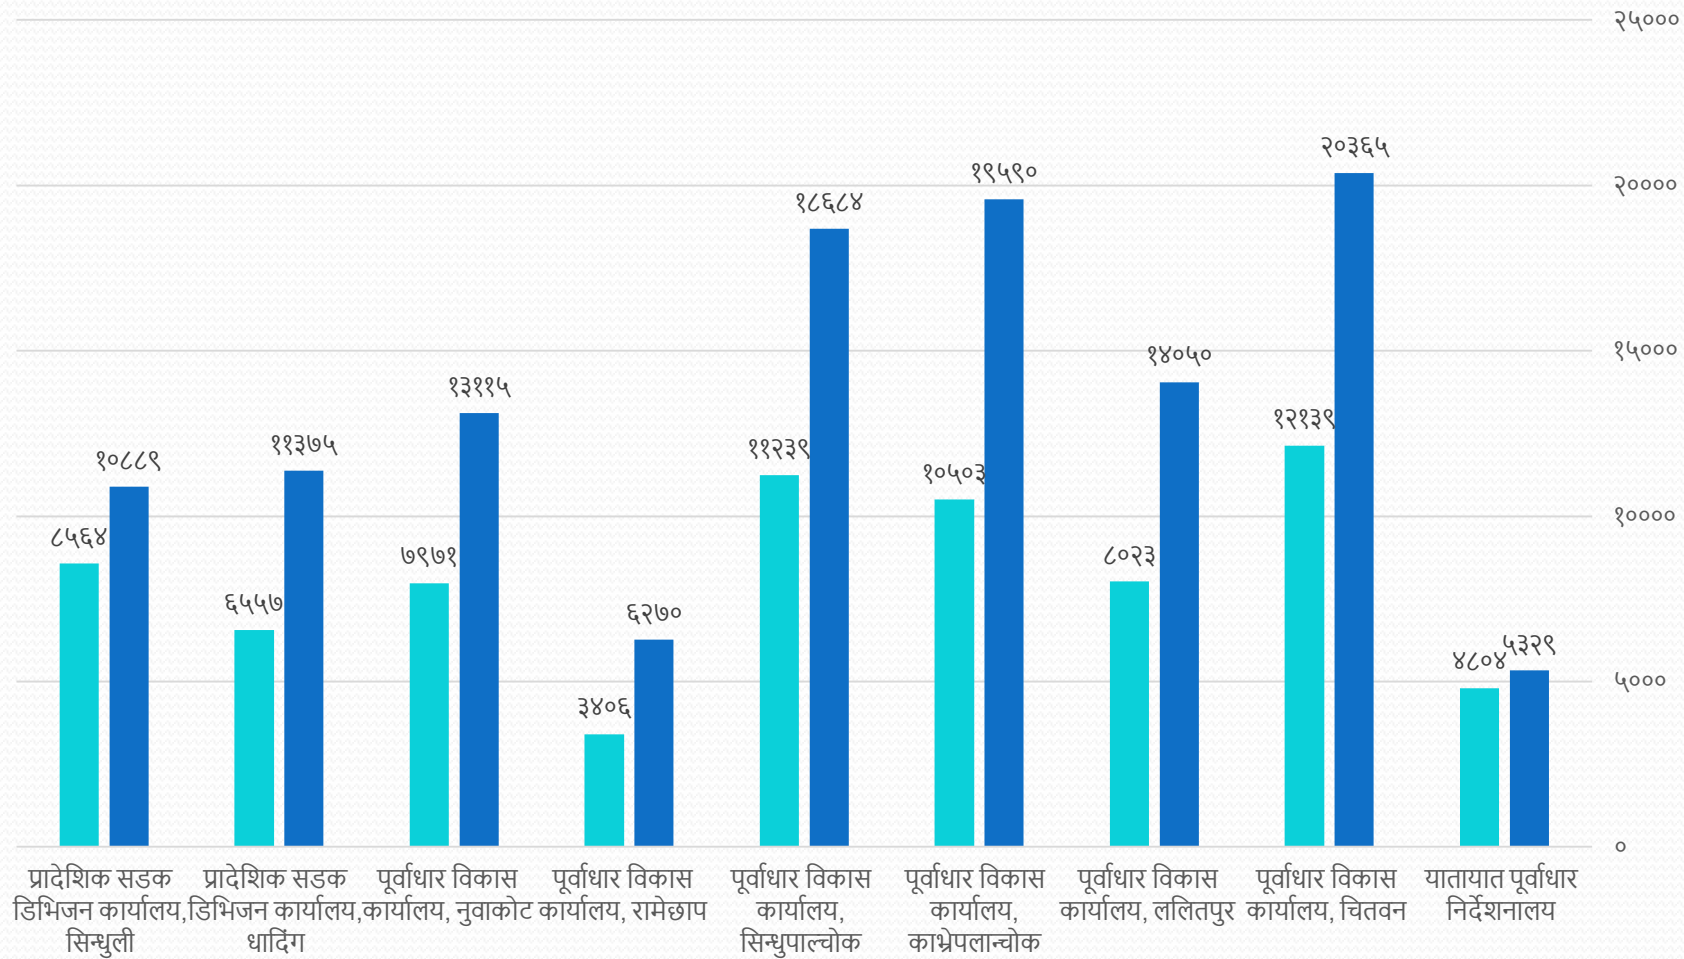

■ पुँजीगत बजेट ■ पुँजीगत खर्च

पुँजीगत खर्च प्रतिशत





कार्यान्वयन भएका आयोजनाहरुको विवरण

सडक तथा सडकपुलको कूल कार्यान्वयनको अवस्था

सि.न	विवरण	कूल योजना संख्या	सम्पन्न भएका योजना	सम्झौता भएका योजना	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना	कार्यान्वयन नहुनाका कारणहरु
१	प्रादेशिक तर्फ	१८	६	१७		१ झो पु अन्य निकायबाट कार्यान्वयन भएको
२	संघीय सशर्त अनुदान तर्फ	२		२		
३	प्रदेश विकास कार्यक्रम (विशेष) तर्फ					
	कूल जम्मा	२०	६	१९		



बहुवर्षिय स्वीकृत प्रादेशिक सडक तथा सडकपुलहरुको योजनागत विवरण (रु. हजारमा)



सि. न	आयोजना को विवरण	लम्बाई (कि.मी. /मिटर)	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	आ.व. ७७/७८ सम्मको खर्च	आ.व. ७८/७९ मा विनियोजित	आ.व. ७८/७९ को खर्च	आ.व. ७९/८० मा विनियोजन	हालसम्मको भौतिक प्रगति %	हालसम्मको वित्तीय प्रगति %	कैफियत
१	भैसे-भीमफेदी सडक	११.५१५	०७७/०३/२४	०८०/०३/२३	४०४८४९.८४४	८२३३७.१९	१०४८९५	१००८९१.७५	१६९०००	४२	45.26	
२	भीमफेदी कुलेखानी (हेभी) सडक स्तरोन्नति आयोजना, मकवनापुर (कालोपत्रे सडक)	15.318	076/10/17	078/10/15	357079.5	247269.155	112100	109810.33		100	100.00	सम्पन्न
३	राप्ती नदी पुल (हेटौंडा ११ र १२ जोड्ने)	२१५	०७६/०६/२७	०७९/०६/२६	२७६४७०.२	158580.52	११७९००	११७८८९.६५	३०००	१००	100.00	सम्पन्न
४	ढोका फेदी पुल भैसे भीमफेदी सडक	३०	०७९/०३/०६	०८०/०३/०५	३४०४३.४		६६००	६०५५.९७	२१६००	१५	17.79	
५	धार्के दोभान झो. पु.	१९०	२०७७/३/२९	२०७८/०९/२७	७९०८.८७	५५३८.४१	२७००	२०९९.१	५००	१००	96.57	सम्पन्न
६	फिरिम दोभान झो. पु.	१५१	२०७७/३/२९	२०७९/७/३०	६७५४.०३	४४१०.३४	१२००	०.	५००		65.30	
७	बिमिरे माझगाउँ झो.	१३५	२०७७/३/२५	२०७८/११/५	६५०१.६४	३७८८.२१	२८००	२७१०.९८		१००	99.96	सम्पन्न



बहुवर्षिय स्वीकृत प्रादेशिक सडक तथा सडकपुलहरुको योजनागत विवरण (रु. हजारमा)



सि. न	आयोजना को विवरण	लम्बाई (कि.मी. / मिटर)	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	आ.व. ७७/७८ सम्मको खर्च	आ.व. ७८/७९ मा विनियोजित	आ.व. ७८/७९ को खर्च	आ.व. ७९/८० मा विनियोजन	हालसम्मको भौतिक प्रगति %	हालसम्मको वित्तीय प्रगति %	कैफियत
८	बेसिकटेरी झो. पु.	३१२	२०७७/२१६	२०७८/११५	१५२२३.८७	९०२४.३६	६२००	६११४.२२		१००	९९.४४	सम्पन्न
९	तापागाउँ पंगर्पू झो. पु.	१२७	२०७७/३२४	२०७८/१११५	५५२४.४४	३५५८.०४	१८००	१४१०.३९		१००	८९.९४	सम्पन्न
१०	डिमादावा झो. पु.	३७४	२०७७/३२१	२०७९/६३०	२६७८१.००	१६००६.८२	८४००	३५६९.१५	१०००	८०	७३.१०	
११	चैनपुर बागमती झो. पु.	३५०	२०७७/३२६	२०७९/९२६	२८८९५.२३	५१४०.४०	९४००	८७३१.८२	१२०००	४५	४८.०१	
१२	आपचौर लिखु झो. पु.	३२१	२०७७/३२६	२०७९/९२६	२९४८६.५०	२६३३.७८	४५००	१०.५	२७०००	३०	८.९७	
१३	पैरे बेलघारी झो. पु.	३०९	२०७७/३२९	२०७९/९२९	२६७०८.६८	५३५०.१९	१००००	९६६०.८१	२१५००	६०	५६.२०	
१४	कर्मचारी आवास भवन निर्माण		०७८/०४/३१	०७९/०८/३०	२९०५७		२००००	१४११९.७९	१५०००	५०	४८.५९	
१५	चुरियामाई सुरुङ्ग मार्ग मर्मत तथा		०७८/०१/१९	०७९/०९/३०	३८४००	५५६७२०३	२५०००	१५४२७.०१	१५०००	६०	५४.६७	



संघीय सशर्तका सडक तथा सडकपुलहरुको योजनागत विवरण (रु. हजारमा)

सि.न	आयोजनाको विवरण	लम्बाई (कि.मी. / मिटर)	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	आ.व. ७७/७८ सम्मको खर्च	आ.व. ७८/७९ मा विनियोजित	आ.व. ७८/७९ को खर्च	आ.व. ७९/८० मा विनियोजन	हालसम्मको भौतिक प्रगति %	हालसम्मको वित्तीय प्रगति %	कैफियत
१	हेटौडा शहरी सडक	११	०७७/०८/०८	०७९/०४/३०	173324	५९४२०.७५	७६५००	६२५५३.५१	58003	70	70.37	सम्पन्न हुने
	कूल जम्मा				173324	59420.75	76500	62553.5	58003	70	70.37	



बहुवर्षिय स्वीकृत प्रादेशिक /सशर्त/समपुरक अनुदानका सडक तथा सडकपुलहरुको कूल दायित्व (रु. हजारमा)

सि.न	आयोजना को विवरण	योजना संख्या	कूल सम्झौता रकम	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८० को विनियोजन	आ.व. ७९/८० मा सम्पन्न गर्न थप दायित्व रकम	आ.व. ८०/८१ को दायित्व रकम	कैफियत
	प्रादेशिक							
	सडक	1	404849.844	183228.941	169000	52620.903		
	सडकपुल/झो पु /अन्य	८	220125.84	96683.778	113600	9842.0581		
	जम्मा	९	624975.68	279912.719	282600	62462.9611		
	सशर्त							
	सडक							
	सडकपुल							
	जम्मा							
	समपुरक							प्रदेश सरकारमा सम्पूर्ण दायित्व सार्ने खालका योजना भए बजेट र संख्या उल्लेख गर्ने
	सडक							
	सडकपुल							
	जम्मा							
	विशेष							
								
								
	जम्मा							
	कूल जम्मा	९	624975.68	279912.719	282600	62462.9611		



हालसम्मको भौतिक प्रगति



क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७७।७८ सम्म	आ.व. २०७८।७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती	कैफि यत
प्रादेशिक तर्फको आयोजनाहरु:						
१.	सडक					
क)	कच्ची सडक	कि.मि. / मि.				
	नयाँ ट्रयाक निर्माण					
	मर्मत सम्भार /संरचना निर्माण					
ख)	ग्राभेल (खण्डास्मिथ) सडक	कि.मि /मि .				
	सव वेसस्तरको स्तरोन्नति					
	नियमित मर्मत सम्भार /संरचना निर्माण					
ग)	कालोपत्रे सडक	कि.मि.	६	८	८	
घ)	ढलान सडक	कि.मि	१.९			
२	सडक पल/द्योलंगे पल	गोटा /मिट	१	१/१०	१/५	



हालसम्मको भौतिक प्रगति



क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७७।७८ सम्म	आ.व. २०७८।७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती	कैफि यत
वित्तीय हस्तान्तरण तर्फको आयोजनाहरु:(सशर्त र विशेष)						
१.	सडक					
क)	कच्ची सडक	कि.मि. / मि.				
	नयाँ ट्रयाक निर्माण					
	मर्मत सम्भार /संरचना निर्माण					
ख)	ग्राभेल (खण्डास्मिथ) सडक	कि.मि /मि .				
	सव वेसस्तरको स्तरोन्नति					
	नियमित मर्मत सम्भार /संरचना निर्माण					
ग)	कालोपत्रे सडक	कि.मि.		११	५	
घ)	ढलान सडक	कि.मि	२	०.५	०.५	

समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र सं	कार्यालय	कच्ची सडक (कि.मि.)					
		नयाँ ट्रयाक निर्माण			मर्मत सम्भार		
		आ.व. २०७७।७८स म्म	आ.व. २०७८।७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती	आ.व. २०७७।७८सम्म	आ.व. २०७८।७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडा						
	पूर्वाधार विकास कार्यालय						
२	सिन्धुपाल्चोक	१८.८	८.२	२६.५	२१०.१	७१.८	४७१.८
	पूर्वाधार विकास कार्यालय						
३	काभ्रेपलान्चोक	३.	३०.	२६.८	३९.७	५०.	४७.३
	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर						
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	१.६	६.५	४.१	०.	४.५	४.
	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन						
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	२९.८	३५.३	४९.१	२४.५	२८.२	१७.७
	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप						
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप		७.७	७.४	१४३.९	५.	२८.२
	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट						
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	६.६	५.	५.९५	०.	४०.	२०.
	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय						
८	धादिंग	६.२	१५.	२४.४	६०.३	७३.५	८५.
	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय						
९	सिन्धुली	२.	१०.	१६.	२.	२०.	८६.
	कूल जम्मा	६८.१	११७.७	१६०.२	४८०.५	२९३.	७६०.

समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र सं	कार्यालय	ग्राभेल (खण्डास्मिथ) सडक(कि.मि)					
		सव वेसस्तरको स्तरोन्नति			नियमित मर्मत सम्भार।संरचना निर्माण		
		आ.व. २०७७।७८स म्म	आ.व. २०७८।७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती	आ.व. २०७७।७८सम्म को लक्ष्य	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडा						
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	११०.९	९.३	५४.३	११३.	१४३.६	१२८.
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	२८.८	४०.	३५.९	२९.६	१६.	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	१४.३	७.६	७.३	१५.	०.५८	०.५१
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	२३.१	८.	४८.२	७१.२		
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	४५.८	१३.९	९.९	५५.७	३३.२	२०.४
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	४४.९	२०.		५५.४	३५.	१०.
८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	८६.४	१९.	५०.७	१३७.१	२४.	२९.
९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	८३.	२५.	२९.	३८.	०.	
	कूल जम्मा	४३७.	१४२.८	२३५.३	५१५.	२५२.४	१८७.९

समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र सं	कार्यालय	कालोपत्रे सडक(कि.मि.)			ढलान सडक(कि.मि.)		
		आ.व. २०७७।७८स म्म	आ.व. २०७८।७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती	आ.व. २०७७।७८सम्म	आ.व. २०७८।७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडा	७.	२१.	१५.	१.९	०.५	०.५
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	१०.९	४५.४	१२.५	७.४	७.९	३.२
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	३४.७	२४.६	१९.४	३.५	१७.	१२.६
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	१४.५	२२.४	४.२	२२.८	२२.२	१९.१
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	१५१.६	४५.५	१३.५	३९.६	१८.५	२६.३
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	४६.५	१५.५	१.८	०.	०.५	०.३
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	३.९	२५.	२८.	५.५	१.५	३.
८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिंग	३८.५	१५.	२.४	०.२	६.८	३.९
९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	४४.२	३७.७	१४.	७.	१.	१.८
	कूल जम्मा	३५१.८	२५२.१	११०.८	८७.९	७५.९	७०.७

समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र सं	कार्यालय	सडक पुल (सं.)			झोलुंगे पुल/ट्रस पुल (सं.)		
		आ.व. २०७७।७८स म्म	आ.व. २०७८।७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती	आ.व. २०७७।७८सम्म	आ.व. २०७८।७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७८।७९ को प्रगती
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडा	१.		१.		९.	४.
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	१०.	५.	३.	१.		
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	११.	४.	१.			
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	९.	५.	२.		२.	२.
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	८.	५.	४.		१.	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	३.	३.	०.			
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	८.	६.	३.			
८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिंग	०.	१.	०.			
९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	०.	६.	५.			
	कूल जम्मा	५०.	३५.	१९.	१.	१२.	६.



आ.व.२०७८ /०७९ वार्षिक समीक्षा अवधिसम्म भएका प्रमुख ठोस उपलब्धिहरू

- Guidelines For Works including Preparation of Detailed Project Report (DPR) of Roads
- Quality Control Guidelines
- Trail Bridge strategy
- Flexible Pavement guidelines
- Provincial Transport Master Plan Inventory
- प्रादेशिक सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका
- सडक क्षेत्रको निजि जग्गामा पर्ने घर,टहरो वा भवनको क्षति पूर्ति निर्धारण कार्यविधि,२०७९
- हेटौडा काठमाडौं जोड्ने सडक खण्ड मध्ये भीमफेदी कुलेखानी खण्ड सम्पन्न
- चुरियामाई सुरंग मार्ग मर्मत तथा व्यवस्थापन कार्य भैरहेको
- राप्ति खोला पक्कि पुल, हेटौडा ११,१२ जोड्ने (२१५ मि) सम्पन्न



नवीनतम कार्य (Module Work)

अन्य कार्यालयले समेत अनुसरण गर्न उपयुक्त **Module Work** को रुपमा
गरिएका कार्य उल्लेख गर्ने

Design and Built अन्तर्गत राप्ति खोला पक्कि पुल निर्माण , हेटौडा ११,१२
जोड्ने (२१५ मि) समय सिमा भन्दा ३ महिना अगावै सम्पन्न



उजुरी/गुनासो फछ्यौटको अवस्था

विवरण	संख्या	कारवाही संख्या	सम्बोधन (फछ्यौट) प्रतिशत
अ.दु.अ.आ उजुरीहरु	नभएको		
हेलो सरकारको उजुरीहरु	नभएको		
सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु	नभएको		
संघ, प्रदेश मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुबाट प्राप्त	नभएको		
कूल			

सेवा प्रवाह/सुशासनको लागि गरिएको उल्लेखनिय प्रयासहरु:

- १.
- २.
- ३.



१. राजश्व संकलन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	राजश्व ख.शि.नं.	राजश्व शीर्षक	संकलित रकम रु.	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक शुल्क	५५०००	
२	१५१११	बेरुजु	५३९२७१	
		कुल जम्मा	५९४२७१	



बेरुजु सम्बन्धि विवरण



सि. न.	आ.व	बेरुजु रकम (रु हजारमा)			फछ्यौट रकम(रु हजारमा)			प्रगति(%)	कैफिय त
		असुल गर्नुपर्ने	नियमित	पेशकी	असुल गर्नुपर्ने	नियमित	पेशकी		
	१०७५/०७६ सम्मको	०	०	०	०	०	०		
	२०७६/०७७	५६.५	१०४.८६	०	५६.५	१०४.८६ ४	०.	१००.	
	३०७७/७८	६७६.७३ ८	१८६९५.१ ९						प्रतिक्रिया पेश गरिएको
	जम्मा	७३३.२३ ८	१८८००.१		५६.५	१०४.८६ ४			



आयोजनाको आ.व.०७८/०७९ को कार्यान्वयनका फोटोग्राफहरु



हेटौडा शहरी सडक







भीमफेदी देउराली कुलेखानी सडक

आयोजना निर्माण चरणको अवस्था



आयोजना निर्माण चरणको अवस्था



राप्ति नदि पुल हेटौडा ११,१२



बेसीकटेरी झोलुंगे पुल नुवाकोट



चुरियामाई टनेल मर्मत कार्य



चुरियामाई टनेल प्रवेश पोर्टल



बिमिरे माझवारी झो पु, नुवाकोट



निर्माणाधीन कर्मचारी आवास भवन



जिल्ला अनुगमन को झलक-प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय,सिन्धुली



प्रि स्ट्रेस स्लाब – बागमती पुल शंखमुल





सि.नं.	आयोजना कार्यान्वयन तथा कार्यालय सञ्चालनमा देखिएका समस्या	समस्या समाधानको लागि गरिएका प्रयासहरू	मन्त्रालयसँग को अपेक्षा
१	निर्माण व्यावसायी हरुले कार्य ढिलो गर्नु /	Regular Contract Management meeting, Main Contractor संग meeting र Bank guarantee को लागि पत्राचार	
२	कार्यालयमा कर्मचारी अत्यन्त न्यून हुनु	डोर हाजिरीमा काम लगाइएको	



कार्यालयको तर्फबाट थप केही सुझाव

१	Contract Management चुस्त,दुरुस्त हुनु पर्ने /		
२	Bridge को Concept Design, Geotechnical Design मा विशेष ध्यान दिनु पर्ने /		
३	निर्देशनालयबाट वनाइएको Pavement Design Guidelines ,Quality Control Guidelines,, Norms आदि follow गर्नु पर्ने /		

ਫਰਾਦ
